

## Stadtrat

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 8. Juli 2020

**2020/127 6.04.03.01 Strassen, Wege, Plätze**  
**Ettenhauserstrasse West, Erneuerung Strasse, Abschnitt Bachtel- bis Sonnenfeldstrasse, Bauabrechnung**


### Beschluss Stadtrat

1. Die durch das Ingenieurbüro Buchmann Partner AG, Uster erstellte Kreditabrechnung vom 22. April 2020 für die Erneuerung der Ettenhauserstrasse, Abschnitt Bachtelstrasse bis Sonnenfeldstrasse, mit Ausgaben von insgesamt Fr. 1'081'887.35 wird genehmigt. Sie schliesst mit Mehrkosten von Fr. 11'887.35 bzw. 1,1 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
  - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an:
  - Buchmann Partner AG, Weiherallee 11, 8610 Uster
4. Mitteilung durch Sekretariat an:
  - Ressortvorstand Tiefbau + Energie
  - Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur
  - Abteilung Finanzen
  - Abteilung Tiefbau
  - Bauleiter Tiefbau
  - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

### Ausgangslage

Mit Beschluss vom 7. Februar 2018 genehmigte der Stadtrat das Ausführungsprojekt der Buchmann Partner AG, Uster für die Sanierung der Ettenhauserstrasse West, Bachtelstrasse bis Sonnenfeldstrasse. Mit gleichem Beschluss wurde ein Kredit von 1'075'000 Franken als gebundene Ausgaben bewilligt. Die Aufträge für die Ausführung der Bauarbeiten wurden aufgrund der Offerte vom 5. Dezember 2017 an die wirtschaftlich günstigste Anbieterin, die Firma Egli Strassenbau AG, Wetzikon vergeben.

Die Bauarbeiten wurden koordiniert mit der Erneuerung der Mischwasser-Kanalisation und den Werkleitungen der Stadtwerke Wetzikon im Zeitraum von Ende Februar 2018 bis Oktober 2018 ausgeführt. Im Juni 2019 erfolgte der Einbau des Deckbelages und die Bauabnahme fand am 29. November 2019 statt.

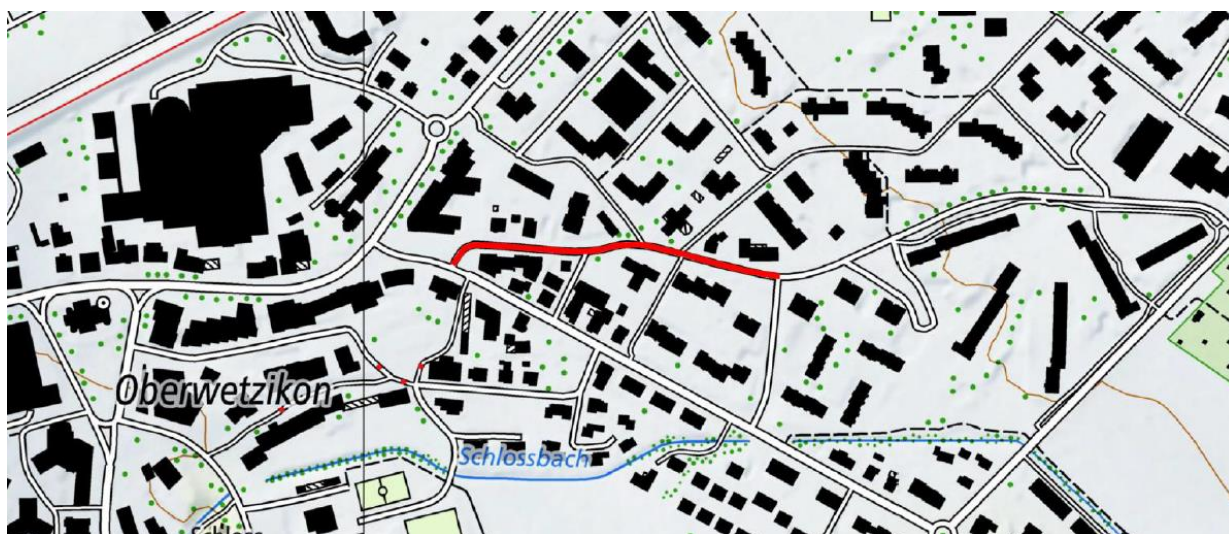

### Kreditabrechnung

Strassenbau Konto 1.223.5010.07 und INV00035-6511.5010.00	KV Fr.	Bauabrechnung Fr.	Differenz Fr.	%
II Bauarbeiten	750'000.00	772'067.70	22'067.70	2,9
III Beleuchtung	50'000.00	51'155.85	1'155.85	2,3
IV Nebenarbeiten	60'000.00	54'687.65	- 5'312.35	- 8,8
V Unvorhergesehenes	40'000.00	29'832.45	- 10'167.55	- 25,4
VI Technische Arbeiten	<u>170'000.00</u>	<u>174'143.70</u>	<u>4'143.70</u>	<u>2,4</u>
Total (inkl. MWST)	<u>1'070'000.00</u>	<u>1'081'887.35</u>	<u>11'887.35</u>	<u>1,1</u>

### Differenzbegründung

Die Mehrkosten lassen sich durch den schlechten Baugrund im Bereich des Kindergartens Goldbühl (ca. 4'000 Franken), die Entsorgung der Schottertränke im Bereich der Bushaltestelle (ca. 10'000 Franken), einem längeren EW-Graben (ca. 1'000 Franken), höherer Vermessungskosten (ca. 4'000 Franken) und den Belagseinbau am Wochenende (ca. 8'000 Franken) begründen.

Minderkosten ergaben sich durch geringere Anpassungsarbeiten (ca. - 5'000 Franken) und nicht benötigte Reserven bei den unvorhergesehenen Arbeiten (ca. - 10'000 Franken).

### Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben (ANR00868).

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Strassen/Verkehrswege	40 Jahre	1401.00	6511.3300.10	1'081'887.35

Anschaffungswert	1'081'887.35
------------------	--------------

### Erwägungen

Die Arbeiten für die Erneuerung der Ettenhauserstrasse West, Abschnitt Bachtelstrasse bis Sonnenfeldstrasse, konnten von Ende Februar 2018 bis Oktober 2018 gemäss Projekt ausgeführt werden. Die Bauabrechnung schliesst gegenüber den bewilligten Kostenvoranschlag mit 1,1 % über dem bewilligten Kredit ab. Sie gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden.

Für richtigen Protokollauszug:



**Stadtrat Wetzikon**

Martina Buri, Stadtschreiberin
